

WBS

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

**PLANERINGSMALLEN SOM GUIDAR DIG
FRÅN ORD TILL HANDLING!**

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

En WBS är en planeringsmetod som guidar dig från ord till handling! Den hjälper dig att bryta ner ditt projekt från ett stelt substantiv som beskriver projektets mål - till en livlig handlingsplan i form av arbetspaket som går att ta action på.

Genom att svara på frågorna i den här mallen planerar du dig snabbt och säkert fram till en överskådlig trädstruktur. Och tänk på att i en WBS är ordningen av uppgifter inte viktig - identifiera **vad** du ska göra **inte** när och i vilken ordning du ska göra det.

TRE BEGREPP INNAN VI BÖRJAR

PROJEKTMÅL

Som projektledare har du en effekt du vill uppnå med ditt projekt - exempelvis effektivisera verksamheten eller ta marknadsandelar i branschen.

Det är utifrån ett effektmål du kan definiera ett **Projektmål** - exempelvis att implementera ett nytt system, ta fram en ny produkt eller genomföra ett event.

En sista sak! Ett projektmål ska vara **SMART**. Det betyder att det är:

- Specifikt
- Mätbart
- Accepterat
- Realistiskt
- Tidsatt

MILSTOLPAR

En milstolpe (även kallat huvudpaket) beskriver ett etappmål eller definierar ett resultat/leverans som behöver inträffa för att projektet ska genomföras. Och för att nå fram till milstolpen behöver vi den sista pusselbiten...

ARBETSPAKET

Den nedersta nivån och sista delen i en WBS är arbetspaketen. Det här är de faktiska uppgifterna och aktiviteterna som ska genomföras.

Det vill säga, dags att gå från ord till handling.

VAD ÄR MÅLET MED DITT PROJEKT?

**VAD ÄR EN MILSTOLPE
ELLER ETAPP I PROJEKTET?**

**VAD ÄR EN UPPGIFT ELLER
AKTVITET TILL MILSTOLPEN?**

**VAD ÄR EN UPPGIFT ELLER
AKTVITET TILL MILSTOLPEN?**



**BESKRIV UPPGIFTENS
EVENTUELLA DELMOMENT**

**BESKRIV UPPGIFTENS
EVENTUELLA DELMOMENT**

**VAD ÄR EN ANNAN
MILSTOLPE I PROJEKTET?**

**VAD ÄR EN UPPGIFT ELLER
AKTVITET TILL MILSTOLPEN?**


**VAD ÄR EN UPPGIFT ELLER
AKTVITET TILL MILSTOLPEN?**



**BESKRIV UPPGIFTENS
EVENTUELLA DELMOMENT**

**BESKRIV UPPGIFTENS
EVENTUELLA DELMOMENT**

DIN WORK BREAKDOWN STRUCTURE

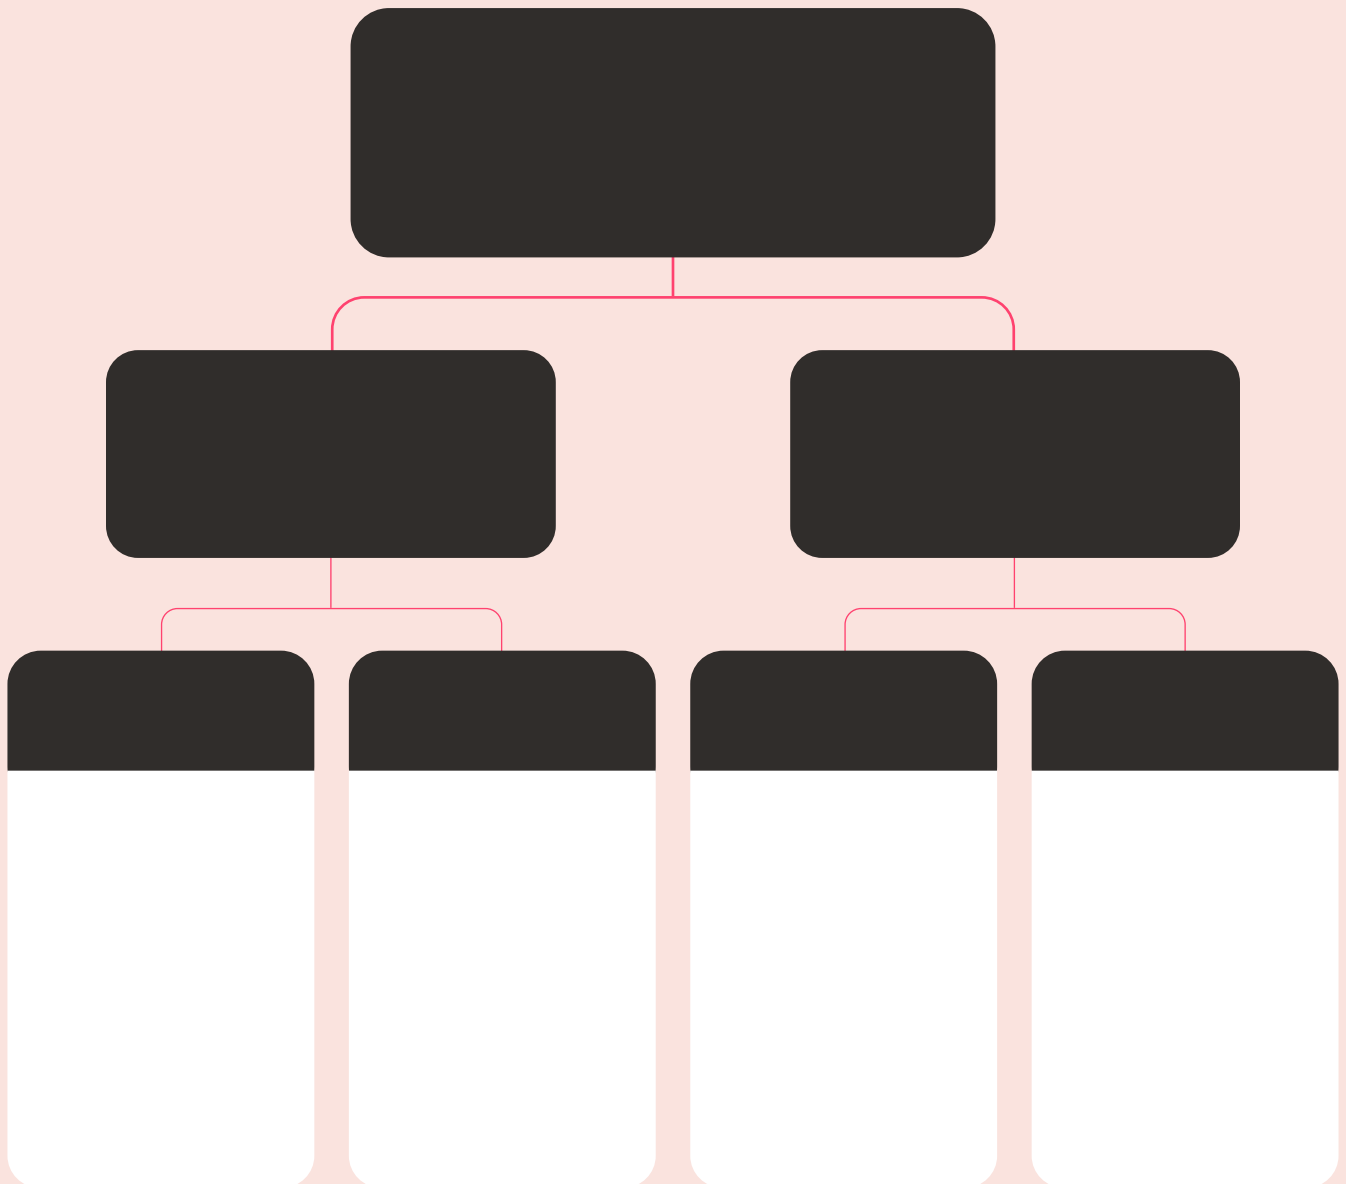

Du är nu klar med din WBS!

Nästa steg är att lyfta ur Milstolparna eller Arbetspaketen (beroende på projektets storlek och komplexitet) och sätta in dem i en nätplan som visar projektets ordning. En nätplan hjälper dig att illustrera beroenden eller samband inom projektet, vilket gör nätplanen till ett bra underlag för projektets kommunikation (både internt och externt). **Lycka till!**
